ITAUEIRA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Manutenção dos prédios públicos do Municipio de Itaueira-PI
Orçamento Sintético
Bancos: SINAPI - 02/2024 - Piauí
B.D.I.: 22,09%
Encargos: 112,53%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 1 Quant.	MEDIÇÃO 1 Valor Unit com BDI	MEDIÇÃO 1 Total	MEDIÇÃO 1 Acumulado
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**8.336,64**			**8.336,61**	**8.336,61**
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1703,87	3,02	3,69	6.287,28	1703,87	3,69	6.287,28	6.287,28
1.5	12625	ORSE-SE	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m²	154,55	10,86	13,26	2.049,33	154,55	13,26	2.049,33	2.049,33
2.5												
3			**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**					**636,24**			**0,00**	**0,00**
3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,32	54,51	66,55	87,85	1,32	66,55	0,00	0,00
3.3	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20	10,96	13,41	268,20	1	13,41	0,00	0,00
3.11	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,46	9,16	11,18	116,94	1	11,18	0,00	0,00
3.12	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,72	23,66	28,89	165,25		28,89	0,00	0,00
3.18												
4			**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**					**3.027,38**			**0,00**	**0,00**
4.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	3,2	577,65	705,25	2.256,80		705,25	0,00	0,00
4.3	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 - reforço estrutural	m³	1	631,16	770,58	770,58		770,58	0,00	0,00
6			**VEDAÇÕES**					**7.475,27**			**0,00**	**0,00**
6.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	42,83	113,91	139,07	5.956,37		139,07	0,00	0,00
6.4	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,2	72,24	88,20	635,04		88,20	0,00	0,00
6.6	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,2	75,61	92,31	664,63		92,31	0,00	0,00
6.9	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,05	87,59	106,94	219,23		106,94	0,00	0,00
8			**REVESTIMENTOS**					**2.628,22**			**0,00**	**0,00**
8.1	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	1	739,47	902,82	902,82		902,82	0,00	0,00
8.2	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1	610,10	744,87	744,87		744,87	0,00	0,00
8.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	m²	10,99	73,08	89,22	980,53		89,22	0,00	0,00
9			**PISO**					**10.773,28**			**0,00**	**0,00**
9.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	0,15	530,51	647,70	97,16		647,70	0,00	0,00
9.2	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3,9	30,78	37,58	146,56		37,58	0,00	0,00
9.5	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	123,32	64,65	78,93	9.733,65		78,93	0,00	0,00
9.7	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	55,31	11,79	14,39	795,91		14,39	0,00	0,00
10			**PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO**					**5.099,06**			**0,00**	**0,00**
10.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	171,57	24,34	29,72	5.099,06		29,72	0,00	0,00
11			**ESQUADRIAS**					**17.110,84**			**0,00**	**0,00**
11.3	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	804,54	982,26	3.929,04		982,26	0,00	0,00
11.7	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,72	341,67	417,14	3.220,32		417,14	0,00	0,00
11.10	7640	ORSE-SE	GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL)	m²	8,4	539,68	658,90	5.534,76		658,90	0,00	0,00
11.11	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,92	736,95	899,74	4.426,72		899,74	0,00	0,00
11.12												
12			**PINTURAS**					**7.378,75**			**0,00**	**0,00**
12.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	168,58	15,88	19,39	3.268,77		19,39	0,00	0,00
12.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	286,21	11,76	14,36	4.109,98		14,36	0,00	0,00
14			**FORRO**					**1.109,48**			**0,00**	**0,00**
14.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	18,23	49,85	60,86	1.109,48		60,86	0,00	0,00
15			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**7.369,42**			**0,00**	**0,00**
15.2	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	292,83	357,52	357,52		357,52	0,00	0,00
15.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	13,40	16,36	49,08		16,36	0,00	0,00
15.5	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	16,20	19,78	39,56		19,78	0,00	0,00
15.10	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	87,29	106,57	106,57		106,57	0,00	0,00
15.11	00002678	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	12	3,01	3,67	44,04		3,67	0,00	0,00
15.13	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	50,00	2,71	3,31	165,50		3,31	0,00	0,00
15.15	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400	4,04	4,93	1.972,00		4,93	0,00	0,00
15.16	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150	6,25	7,63	1.144,50		7,63	0,00	0,00
15.17	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	8,73	10,66	1.066,00		10,66	0,00	0,00
15.20	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	17	1,99	2,43	41,31		2,43	0,00	0,00
15.22	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	51,93	63,40	951,00		63,40	0,00	0,00
15.23	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	73,36	89,57	179,14		89,57	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha nº 519
Proc. nº 210
Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha n 520
Proc. n 24-8/24
Ass n

15.32	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	128,31	156,65	1.253,20	156,65	0,00	0,00
16			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**2.502,12**		**0,00**	**0,00**
16.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12	18,66	22,78	273,36	22,78	0,00	0,00
16.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20	21,52	26,27	525,40	26,27	0,00	0,00
16.3	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5	29,40	35,89	179,45	35,89	0,00	0,00
16.6	00011868	SINAPI	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	665,58	812,61	812,61	812,61	0,00	0,00
16.13	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	7,32	8,94	53,64	8,94	0,00	0,00
16.14	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	8,71	10,63	31,89	10,63	0,00	0,00
16.15	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	11,95	14,59	14,59	14,59	0,00	0,00
16.27	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	9,14	11,16	11,16	11,16	0,00	0,00
16.28	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	6,52	7,96	15,92	7,96	0,00	0,00
16.32	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	12,01	14,66	29,32	14,66	0,00	0,00
16.33	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	10,15	12,39	49,56	12,39	0,00	0,00
16.36	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	121,47	148,30	296,60	148,30	0,00	0,00
16.42	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	85,44	104,31	208,62	104,31	0,00	0,00
17			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**18.450,00**		**0,00**	**0,00**
17.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12	19,11	23,33	279,96	23,33	0,00	0,00
17.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6	23,94	29,23	175,38	29,23	0,00	0,00
17.4	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	15	25,01	30,53	457,95	30,53	0,00	0,00
17.8	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2	92,64	113,10	226,20	113,10	0,00	0,00
17.12	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2	449,45	548,73	1.097,46	548,73	0,00	0,00
17.14	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	5.783,62	7.061,22	7.061,22	7.061,22	0,00	0,00
17.16	00039363	SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	UN	1	5.974,44	7.294,19	7.294,19	7.294,19	0,00	0,00
17.18	00037949	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4	1,82	2,22	8,88	2,22	0,00	0,00
17.19	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	2,51	3,06	6,12	3,06	0,00	0,00
17.21	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	6,82	8,33	16,66	8,33	0,00	0,00
17.23	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	235,77	287,85	575,70	287,85	0,00	0,00
17.26	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	512,03	625,14	1.250,28	625,14	0,00	0,00
18			**ACESSIBILIDADE**					**989,48**		**0,00**	**0,00**
18.3	00036223	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4	202,61	247,37	989,48	247,37	0,00	0,00
19			**DRENAGEM PLUVIAL**					**8.468,32**		**0,00**	**0,00**
19.1	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,15	133,78	163,33	2.311,12	163,33	0,00	0,00
19.8	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	100	42,36	51,72	5.172,00	51,72	0,00	0,00
19.13	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	20	40,35	49,26	985,20	49,26	0,00	0,00
20			**DIVERSOS**					**340,82**		**0,00**	**0,00**
20.4	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	m	3,26	85,63	104,55	340,82	104,55	0,00	0,00
21			**SERVIÇOS FINAIS**					**251,57**		**0,00**	**0,00**
21.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	123,32	1,68	2,04	251,57	2,04	0,00	0,00

Total sem BDI	**79.428,38**
Total do BDI	**22.520,51**
Total Geral	**101.948,89**

João Victor Almeida da S. Feitosa

JOÃO VICTOR ALMEIDA DA SILVA FEITOSA
Engenheiro Civil
CREA-PI 1921414839


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha n 521
Proc. n 2603/24
Ass.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Custos:	SINAPI – PI, fev/ 2024
Município: Itaueira - PI		ORSE, abril/ 2024
Objeto: Manutenção dos prédios publicos do municipio de Itaueira-PI	Leis Sociais:	112,53%
	BDI:	22,09%

Placa de obra - (3,20 x 2,00) m (COMPOSIÇÃO 1) - ORSE 51 ADAPTADO					UNIDADE: m²
Mão-de-obra	Quant.	Unid.	Referência	Salário hora	Custo horário
Carpinteiro de formas com encargos complementares	1,000	h	SINAPI 88262	25,64	25,64
Servente com encargos complementares	1,999	h	SINAPI 88316	20,64	41,26
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]					66,90
Materiais	Quant.	Unid.	Referência	Valor R$	Custo unitário
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao	1,00	m	SINAPI 4417	4,08	4,08
Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao	4,00	m	SINAPI 4491	9,59	38,36
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	1,00	m²	SINAPI 4813	250,00	250,00
Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	0,15	kg	SINAPI 5075	21,11	3,17
Custo unitário total dos materiais [2]					295,61
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3]					**362,51**
B.D.I. = 22,09% [4]					**80,08**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5]					**442,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha n 522
Proc. n 2102/24
Ass n

X - ISOLAR PORTA LATERAL
02 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, RAMPA E DEGRAU

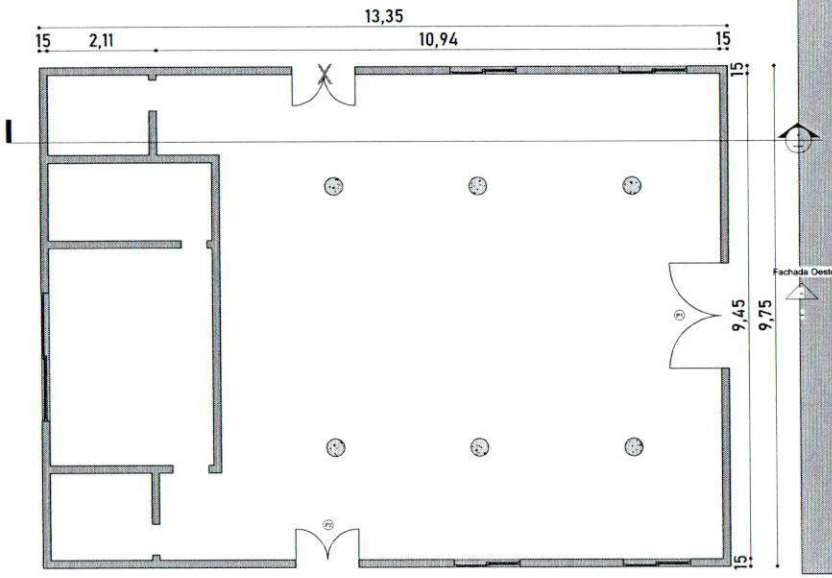

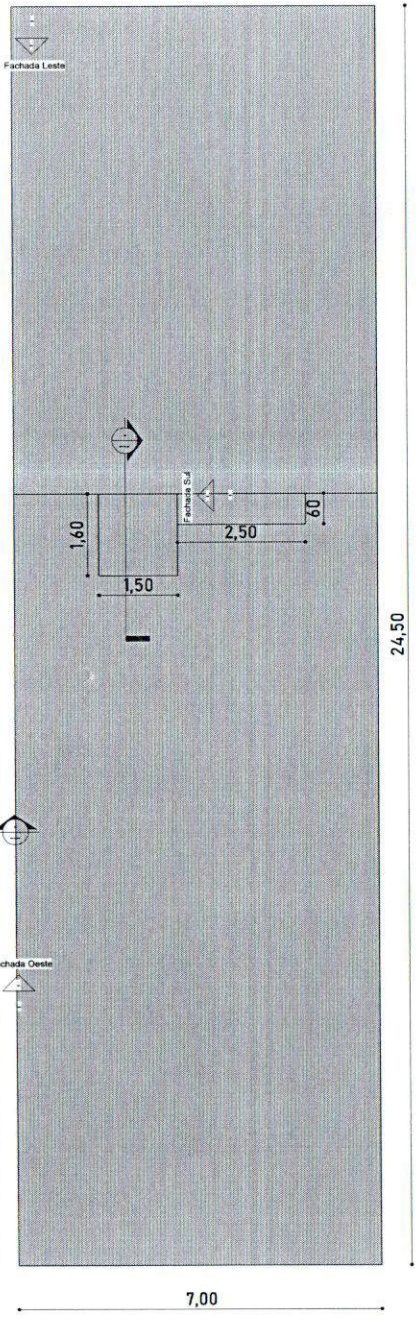

1 TÉRREO
1 : 50

Resp. Projeto:	JOÃO VICTOR ALMEIDA DA S. FEITOSA
Resp. Desenho:	JOÃO VICTOR ALMEIDA DA S. FEITOSA
	Data: 08/03/2025
Assunto:	PLANTAS BAIXAS
Título:	REFORMA CEMITÉRIO
Cliente:	PREFEITURA DE ITAUEIRA
Local:	CEMITÉRIO MUNICIPAL
Escala:	1 : 50
Folha:	01 /01

JOÃO VICTOR

* Todos os direitos reservados
